

生コンクリート中の塩化物含有量試験表

株式会社 葦上建設 殿

2025年12月23日

株式会社 星山生コン

TEL (076) 321-5896

FAX (076) 311-1826


工 事 名	舗装新設工事（嵯峨緯126号線）										
打設箇所	土間										
呼 び 方	普通 21- 8-20BB W/C≤60										
配 合	セメント	水	細 骨 材			粗 骨 材				W／C	s／a
			砕砂	陸砂		砕石	砕石			(%)	(%)
	280	165	264	617	――	478	479	――	――	59	48.8
kg/m ³	混 和 材				混 和 剤						
			シ-ホ-ゾリス15S								
	――		――			2.240		――		――	
試 験 日	2025年12月23日										
測定器名	カンタブ										
試 験 結 果		1	2	3	塩化物含有量(kg/m ³) = 塩素イオン濃度(%)×単位水量(kg/m ³) 100						
	測定機器の読み	3.2	3.2	3.2							
	塩素イオン濃度(%)	0.0165	0.0165	0.0165	規 格 値	0.30 kg/m ³ 以下					
	単位水量(kg/m ³)	165			平 均 値	0.03(kg/m ³)					
	塩化物量(kg/m ³)	0.027	0.027	0.027	判 定	◎					

備考：

■換算表の張り付け位置

■測定器の張り付け位置

カンタブ 低濃度品 換 算 表					
Lot.No. 759124					
読み	塩素イオン (%)	読み	塩素イオン (%)	読み	塩素イオン (%)
1.8	0.0099	4.0	0.0220	6.2	0.0530
1.9	0.0104	4.1	0.0228	6.3	0.0552
2.0	0.0108	4.2	0.0237	6.4	0.0574
2.1	0.0112	4.3	0.0246	6.5	0.0598
2.2	0.0116	4.4	0.0256	6.6	0.0622
2.3	0.0121	4.5	0.0266	6.7	0.0648
2.4	0.0125	4.6	0.0277	6.8	0.0674
2.5	0.0130	4.7	0.0288	6.9	0.0701
2.6	0.0134	4.8	0.0300	7.0	0.0729
2.7	0.0139	4.9	0.0312	7.1	0.0758
2.8	0.0144	5.0	0.0325	7.2	0.0788
2.9	0.0149	5.1	0.0338	7.3	0.0819
3.0	0.0154	5.2	0.0352	7.4	0.0851
3.1	0.0159	5.3	0.0367	7.5	0.0884
3.2	0.0165	5.4	0.0382	7.6	0.0918
3.3	0.0171	5.5	0.0398	7.7	0.0954
3.4	0.0177	5.6	0.0415	7.8	0.0990
3.5	0.0183	5.7	0.0432	7.9	0.1027
3.6	0.0190	5.8	0.0450	8.0	0.1066
3.7	0.0197	5.9	0.0469	8.1	0.1106
3.8	0.0204	6.0	0.0488		
3.9	0.0212	6.1	0.0509		
太平洋マテリアル株式会社					

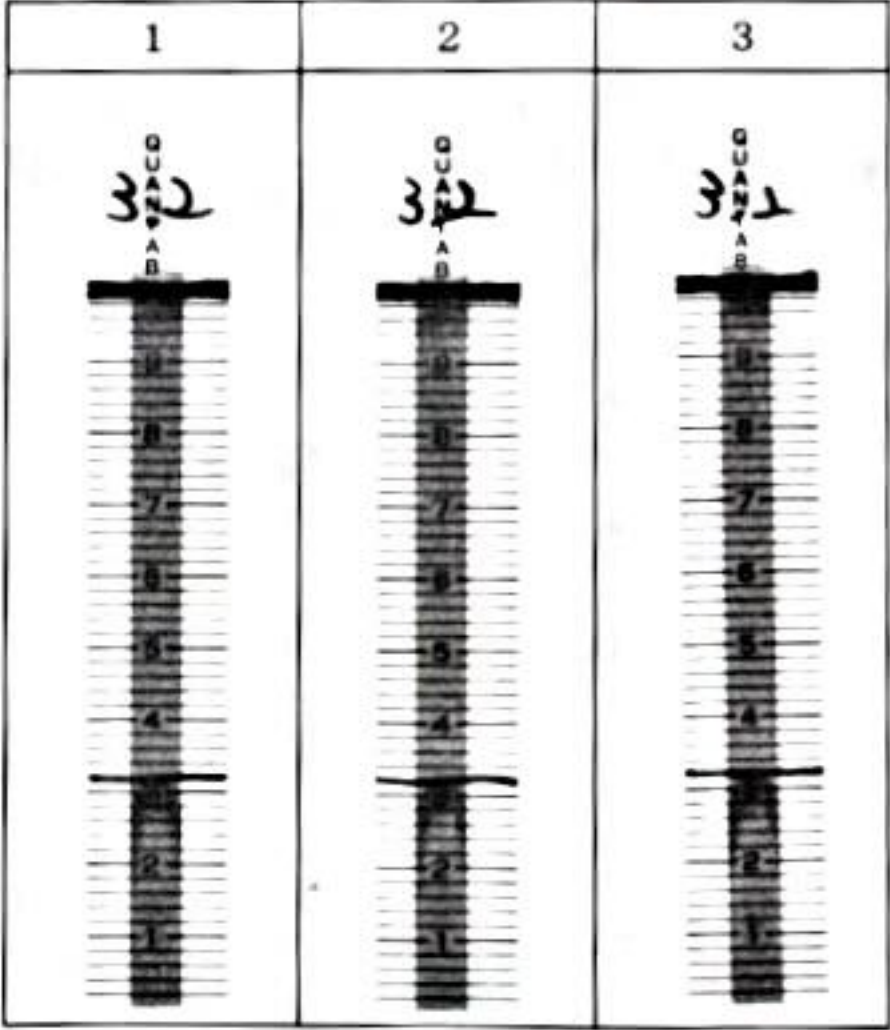

測定者	星山 佑太郎	測定番号	
-----	--------	------	--
