

令和7年12月5日

舗装新設工事（嵯峨緯 126 号線）

施工計画

株式会社 藪上建設

1. 工事概要	
2. 計画工程表	
3. 現場組織表	
4. 指定機械	
5. 主要資材	
6. 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等含む。）	
7. 施工管理計画	
8. 安全管理	
9. 緊急時の体制及び対応	
10. 交通管理	
11. 環境対策	
12. 現場作業環境の整備	
13. 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法	
14. その他	

1, 工事概要

工事名	舗装新設工事
路線名	(嵯峨緯 126 号線)
工事場所	京都市右京区嵯峨折戸町
工 期	自 令和 7 年 9 月 26 日 至 令和 8 年 2 月 6 日
請負代金	¥ 1,315,600 (うち消費税 119,600) 円
発注者	西部土木みどり事務所課 T E L 075-871-6721
受注者	株式会社 藪上建設
住 所	京都市伏見区淀下津町 139-9 T E L 075-632-2657

工事内容

名称・規格		単位	数量
舗装		式	1
道路土工		式	1
掘削工		式	1
掘削	土質：土砂、施工方法：現場制約あり	m ³	6
人力積込	土質：土砂、作業内容：土砂・廃路盤材積込	m ³	6
残土処理工		式	1
土砂運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m ³	5
残土等処分	土砂	m ³	5
廃路盤材運搬		m ³	0.2
残土処分（廃路盤）		m ³	0.2
舗装工		式	1
アスファルト舗装工		式	1
フィルター工	山砂、仕上がり 50mm	m ²	50
上層路盤工	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m ²	50
表層工	材料種類:再生開粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均 幅員:1.4m 未満(1層当たり平均仕上り厚 40mm 以下)	m ²	50
付帯工		式	1
土間コンクリート	21ー 8ー 20BB	m ²	14
集水桝設置 240 用		個	1
集水桝設置 300 用			1
構造物撤去工		式	1
構造物取壊し工		式	1
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²	1 1
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m ³	0.6
運搬処理工		式	1
殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込条件:人力積込,DID 区間の有無:有	m ³	0.5
殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込 条件:人力積込,DID 区間の有無:有	m ³	0.6
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m ³	0.5
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無菌）	m ³	0.6
仮設工		式	1
交通管理工		式	1
交通誘導員	B	人日	1 2

計画工程表


工 事 名 舗 装 新 設 工 事 (嵯 峨 緯 126 号 線) 道 路 工 事

契約年月日 令和7年9月26日

工 期 令和7年9月26日から令和8年2月6日まで

[illegible]

現場組織表

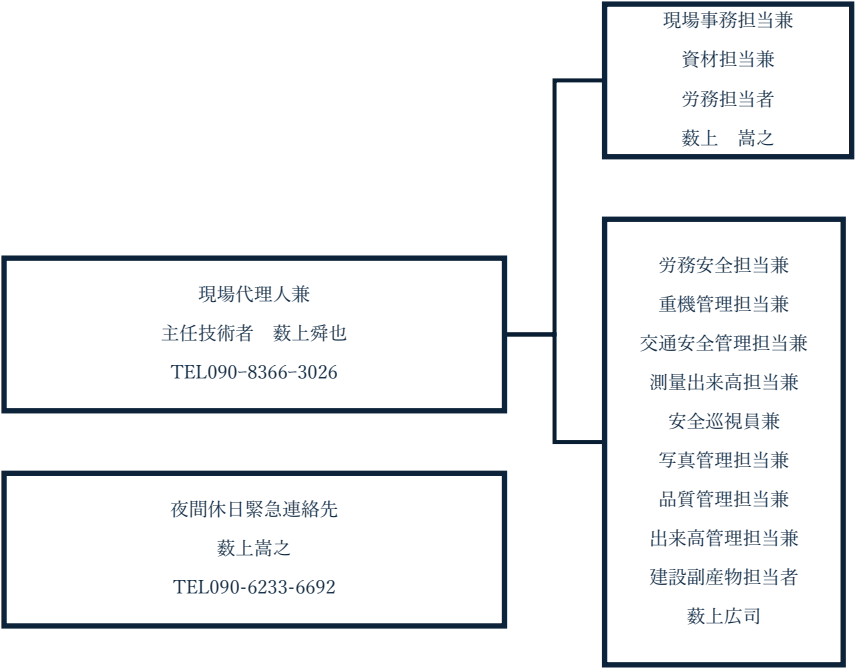

指定機械

指定機械使用計画

特記仕様書に基づき低騒音、排出ガス対策型の建設機械を使用する。

[illegible]

主要資材

品名	規格	単位	数量	11月	12月	1月	製造業者	品質証明
再生粒度調整碎石	R C - 3 0	t	11.27				玉井道路	材料試験表
開粒度アスコン	(1 3)	t	5				玉井道路	事前審査書
コンクリート	21-8-20 BB	m ³	1.75				星山コンクリート	試験成績表
山砂	75μm 通過 6%以下	t	4.1				玉井道路	材料試験表
会 所 桧	240 本体	個	1				柳生建材	試験成績表
会 所 桧	240 用コンクリート蓋	枚	1				柳生建材	試験成績表
会 所 桧	300 本体	個	1				柳生建材	試験成績表
会 所 桧	300 用細目グレーチングT20	枚	1				柳生建材	検査証明書
ワイヤーメッシュ	Φ6×150mm1×2mm	枚	9				柳生建材	検査証明書

施工方法

本工事は、路面が荒れているため、路面を新たに新設し、安全・円滑な通行ができるようにするため。
施工に際しては、工事内容・現場状況・交通状況の諸条件と関係法令及び諸機関との協議事項に基づき施工すると共に、「設計図書」、「特記仕様書」、「土木請負工事必携（令和7年9月・京都市）」を遵守する。
また、工事の円滑な進捗を図れる様、現場の諸状況を十分に把握し、トラブルが生じないように細心の注意を払って施工を行なう。

施工準備

1) 地域住民への協力依頼

工事施工に先立ち地域住民への工事概要の説明を行い、住民の理解を得て工事に着手する。
また施工区域はカラーコーン・誘導看板により明確に明示し、地域住民及び第三者が区域内に安易に立ち入らないよう対処する。

2) 事前測量工

工事着手前に監督員の立会の下、現地施工範囲を確定し世界測地系を基に実施する。

3) 設計図書の照査

工事施工に先立ち、設計図者の誤謬・脱等を確認し、現地と図面との設計照査を行ない、異なる箇所あるいは疑問点が生じた場合は事前に監督員に報告し確認を行う。

4) 立会い

監督員の立会い並びに検査については、施工立会い、段階確認、材料の検査・試験について設計図書の設計表示に基づき責任をもって行うと共に、監督員の立会いを受け、工事を行う。
但し、立会いを得られない場合には、資料記録、記録写真等を遅滞なく提出し机上にて監督員の確認を受ける。

7) 埋設物及 支障物の確認


工事区間内及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して、支障を及ぼさないよう必要な措置を施す。また、支障物件については、関係官庁及び監督員に報告し、各関係官庁及び業者と協議する。

8) その他

事前に各交通規制時における保安施設計画を監督員と協議し、所轄管署に道路使用許可申請を行い、許可後、許可条件及び指導等を踏まえ保安施設を完備し工事に着手する。
本工事現場の実状に応じた十分な保安施設を施した後、本工事に着手する。

官公庁への手続き等
警察署 80 条協議書

施工フロー 全体-詳細

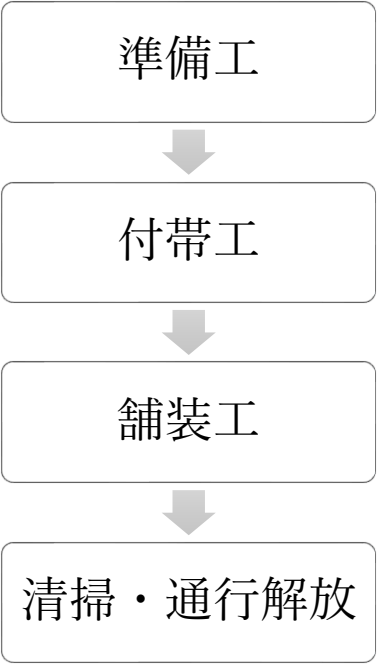


準備工

施工で事故が起こらないように行う工程であり、思いつく限りの最善を尽くし、安全を念頭に置き施工にあたる。

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| その1 看板設置 | 施工にあたって用意し施工開始前に設置する |
| その3 施工時期を記載した看板の設置 | 着工2週間前には勘案を配置し近隣住民、通行人に周知 |
| その4 工事区域の明示 | 施工前の看板で明示する |
| その5 地域住民への説明 | 地域住民と対面で説明を行うことにより、理解を深めてもらう |
| その6 測量・設計照査 | 施工を円滑に進めるとともに、施工範囲を厳密に深く理解するため |




作業フロー




付帯工

古くなった枳を新しいものにすることで路面の排水性の向上と滞水を防止することが目的である。

そのため、枳のみの交換になり、既設排水管をそのまま残すため枳を丁寧に撤去しなければならない。まず、既設枳の周りを掘削し既設排水管をチェックするその後既設排水管周りのコンクリートからチップングを順に行い、排水管を破損させないように注意する。その後既設土間部分にカッターを入れ少しずつ住居に傷を入れないように留意して撤去を行う。

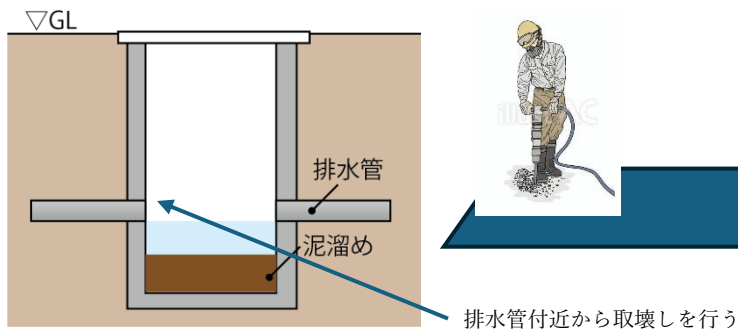

その後、CO 切断し打設する部分としない部分を分離その時の注意として配管に注意して丁寧に切断を行う。その後チップングを済ませて殻を一輪車で積込。




その後、路盤整正を行い、サイコロを敷きメッシュワイヤーを入れ、枳据付を行う。枳据付に際しての留意事項、床掘をする際排水管を傷つけないように丁寧に掘り進めること。据付の際は手を滑らさないように慎重に行う。




コンクリート舗装工

打設にあたっての留意事項、CO を壁に付着させて汚すことがあるため、飛散ないように一輪車から降ろす際は、丁寧かつ慎重に流し込む。金鍬で押さえ、時間を置いてから仕上げに刷毛を使い丁寧に仕上げる。




作業フロー

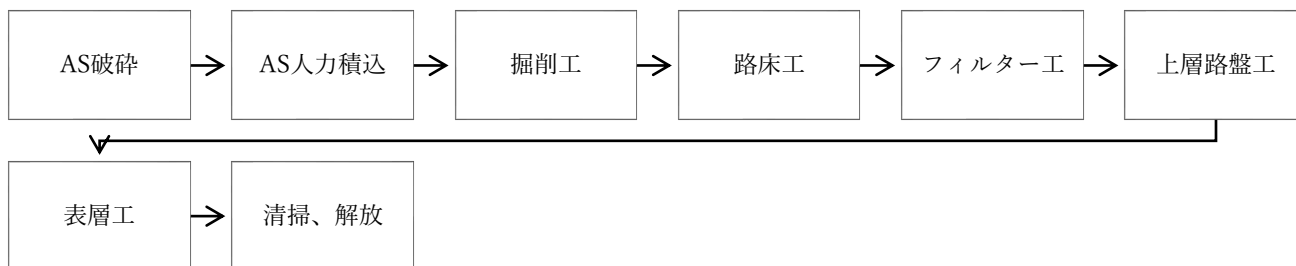

アスファルト舗装工

アスファルト破碎をする際の留意事項、アスファルトを割るときは飛び散ることが多いため、チップングによりできるだけ、力を用いない方法で破碎し、飛び散りを防ぐ。積込の際は一輪車と、AS で指を挟まないように注意して積み込みを行う。



掘削工

掘削工での懸念事項はバックホウを用いて掘削を行うこと。
道の狭さから旋回ができない。埋没物がある可能性を考慮して、
段階的に丁寧に掘り進めていく方法を取り、
作業を進行させていく。

路床工

路床は、での注意事項はフィルター層や上層路盤の仕上がりにもかかわってくるためできるだけ丁寧に整正し、
次の工程に差し替えのない形に仕上げる。
その後ハンドローラーで転圧を行い、締め固める。

フィルター層工

山砂を入れる際、確実に厚みを入れ踏み固めて
次の工程につなげる必要がある。
整正する際注意すべき点が、山砂は起伏がしやすいため慎重に行い
できるだけ均一に整正する。
排水性にかかわる問題だと念頭に置いて作業を行う。



上層路盤工

上層路盤の注意事項は、次の表層工に直結する工程になる。そのため敷き均し、整正を丁寧にを行い、撒水を行いながら丁寧に締め固めをハンドローラーで行う。

表層工

アスファルトの温度が高いため、火傷や、油を含むものになるため、
土間や壁ほかの既設物を汚さないように注意して作業を行う。
一輪車でアスファルト運搬を行い、敷き均す。平坦性を出すため、
転圧時できる限りローラーを止めず、引き返す際は注意を払って行う。

施工管理計画書

工程管理計画

1. 工程管理の目的

本工事は、設計図書・土木工事共通仕様書等に基づき、品質・安全を確保しつつ工期内に完成させることを目的として工程管理を行う。歩道工事であり、通行確保および天候の影響を受けやすいことから、交通規制計画、資材手配、養生期間を含めて工程を管理する。

2. 工事概要（工程管理の前提）

- コンクリート舗装（土間コン）：14.6 m²（型枠あり）
上層路盤 t=10cm → 型枠組立 → コンクリート舗装 t=10cm（打設・仕上げ・養生）
- アスファルト舗装（透水性舗装構造）：49.5 m²
フィルター層 t=5cm → 上層路盤（RC-30 等）t=15cm → 表層（開粒度 As）t=4cm

3. 工程表の作成・進捗管理方法

工程表はバーチャート（工程表）により作成し、日々の進捗は作業日報（作業内容・出来高・人員・使用機械）、工事写真、出来形・品質記録により確認する。

工程遅延のおそれが生じた場合は、速やかに工程の見直しを行い、必要に応じて監督職員と協議する。

4. 工程管理体制

工程管理の責任者は現場代理人とし、作業開始前に当日の作業内容、重機動線、歩行者動線、保安設備、交通規制の確認を行い、関係者へ周知する。

5. 施工順序（管理上の原則）

各工程は、出来形・品質確認（必要写真含む）を完了した後に次工程へ移行する。

特にフィルター層・路盤等の不可視部は、施工状況および厚さ等を写真・記録で確実に残す。

6. 日割工程（作業計画：4 作業日）

下記を基本計画とする（現場条件により一部前後・並行施工する場合は、品質・安全を確保した上で調整する）。

【コンクリート舗装（土間コン） 14.6 m²：2 日】

1 日目（路盤～型枠組立まで）

- ・ 施工範囲確認、掘削・路床整正（必要に応じ転圧）
- ・ 上層路盤 t=10cm 敷均し・転圧
- ・ 型枠組立（高さ・通り・勾配確認）

2 日目（打設・仕上げ・養生開始）

- ・ コンクリート打設 t=10cm、締固め・仕上げ
- ・ 養生（方法・期間は設計図書・共通仕様書に従い実施）
- ・ 立入防止・歩行者動線確保（バリケード等）

【アスファルト舗装 49.5 m²：2 日】

1 日目（路床整正～フィルター層～上層路盤まで）

- ・ 掘削・路床整正、転圧
- ・ フィルター層 t=5cm 敷均し・転圧（泥分混入防止）
- ・ 上層路盤 t=15cm 敷均し・転圧（不陸調整・仕上げ整形）
- ・ 出来形（厚さ等）確認・写真整理

2 日目（表層：開粒度 As～仕上げ）

- ・ 表層（開粒度 As）t=4cm 敷均し・転圧（温度管理）
- ・ 端部処理、段差・不陸の是正、清掃
- ・ 規制・保安設備の復旧／撤去（供用条件は指示に従う）

7. 工程管理上の留意事項（遅延要因と対策）

- ・ 天候（降雨）：雨天時は施工を中止し、路床・フィルター層への泥分混入を防止する。再開時は含水状態を確認し、必要に応じて整形・手直しを行う。
- ・ 資材・プラント手配：開粒度 As は事前に出荷手配を確定し、運搬時間・温度低下を考慮して施工開始時刻を調整する。
- ・ 歩行者動線：歩道工事のため、通行確保・誘導員配置・区画分け施工等により安全を確保する。
- ・ 養生（コンクリート舗装）：養生期間中は立入防止措置を継続し、供用開始の判断は設計図書・監督職員指示に従う。

8. 工程遅延時の是正措置

遅延が生じた場合は、作業班増員、作業時間の調整、施工区間の分割、段取り替え等により工程回復を図る。品質・安全を損なうおそれがある場合は無理な工程短縮は行わず、必要に応じて監督職員と協議する。

品質管理計画

1. 目的

本工事の品質管理は、設計図書及び土木工事共通仕様書等に基づき、所定の品質を確保することを目的として実施する。材料受入確認、施工時管理（温度・転圧・層厚等）、試験・検査及び記録整理を施工と並行して速やかに行い、不適合が認められた場合は原因究明・是正措置・再確認を行った上で次工程へ移行する。

2. 準拠

品質管理は、設計図書（特記仕様書、図面、数量計算書等）、土木工事共通仕様書、施工管理基準（品質管理基準）、材料規格（JIS 等）、発注者の施工計画書作成要領に基づき実施する。品質管理基準において試験区分が「必須」とされる項目は全面的に実施し、基準にない項目を適用する場合又は現場条件により試験方法を変更する場合は、事前に監督職員と協議する。

3. 品質管理体制

品質管理の責任者は現場代理人とし、主任技術者（または担当者）を品質管理担当者として配置する。品質管理担当者は、材料受入時確認、施工時の管理値確認、試験・計測の実施、結果の整理・保管を行い、監督職員の請求に対し速やかに提示できる体制とする。

4. 管理方法（総則）

品質管理は、以下の手順により実施する。

- (1) 材料受入確認：材料証明・納品伝票の確認、外観確認（異物混入・含水等）
- (2) 施工時管理：層厚、転圧回数、含水調整、温度管理（アスコン・コンクリート）
- (3) 試験・検査：品質管理計画表に基づき実施し、結果を記録する
- (4) 不適合対応：施工停止→原因究明→是正→再確認→記録
- (5) 記録整理：試験成績、計測記録、写真、黒板と紐付けて保管

5. 対象工種

【アスファルト舗装部】フィルター層（山砂（洗い） $t=5\text{cm}$ 、 $75\mu\text{m}$ 通過 6%以下）、上層路盤（RC-30 等 $t=10\text{cm}$ ）、表層（開粒度アスファルト混合物 $t=4\text{cm}$ ）

【コンクリート舗装（土間コン）】上層路盤 $t=10\text{cm}$ 、型枠組立、コンクリート舗装 $t=10\text{cm}$ （打設・仕上げ・養生）

6. 不適合発生時の処置

不適合が確認された場合は、当該工程を一時停止し、不適合内容を記録（写真・数量・位置関係）する。原因を究明し、是正方法（やり直し、補修、代替案等）を検討のうえ監督職員と協議し、合意した是正方法により是正を実施する。是正後は再確認（再測定・再試験・写真）を行い、記録を残す。

7. 記録・提出（提示）

品質管理の記録（材料証明、試験成績、温度記録、出来形確認結果、写真等）は工種ごとに整理し、監督職員の請求に応じて速やかに提示できるよう保管する。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験 区分	試験項 目	試験方法	規格値	試験時期・頻度	摘要	試験成 績表等 による 確認
35 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	「舗装施工便覧」3-3-2（3）による。	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000㎡あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t以上3,000t未満（コンクリートでは400㎡以上1,000㎡未満）。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1）アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以上のもの	事前審査 報告書参考

32 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	碎石・玉砕、製鋼スラグ（SS） 表乾比重：2.45 以上 吸水率：3.0%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	
32 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量：0.25%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	

32 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	粗骨材の形状試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-51	細長、あるいは偏平な石片：10%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	
32 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	フィラーの粒度試験	JIS A 5008	「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	

32 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	フィラーの水分試験	JIS A 5008	1%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	
32 排水性舗装工・透水性舗装工	プラント	必須	粒度(2.36mmフルイ	舗装調査・試験法便覧[2]-16	2.36mm ふるい：±12%以内基準粒度	・中規模以上の工事：定期的または随時。・小規模以下の工事：異常が認められたとき。印字記録の場合：全数または抽出・ふるい分け試験 1～2 回／日	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	

32 排水性舗装工・透水性舗装工	プラント	必須	粒度 (75μm フルイ)	75μm ふるい：±5%以内基準粒度	75μm ふるい：±5%以内基準粒度	・中規模以上の工事：定期的または随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。印字記録の場合：全数または抽出・ふるい分け試験 1～2 回／日	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	
32 排水性舗装工・透水性舗装工	プラント	必須	アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-318	アスファルト量：±0.9%以内	・中規模以上の工事：定期的または随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。印字記録の場合：全数または抽出・ふるい分け試験 1～2 回／日	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。 ・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。 ①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。 1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	

32 排水性舗装工・透水性舗装工	プラント	必須	温度測定（アスファルト・骨材・混合物）	温度計による。	配合設計で決定した混合温度。	随時	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が 10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 3,000t 以上の場合が該当する。・小規模工事は管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、以下のいずれかに該当するものをいう。①施工面積で 1,000m ² 以上 10,000m ² 未満②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が 500t 以上、3,000 t 未満(コンクリートでは 400m ³ 以上、1,000m ³ 未満)。ただし、以下に該当するものについても小規模工事として取り扱うものとする。1)アスファルト舗装：同一配合の合材が 100t 以上のもの	
32 排水性舗装工・透水性舗装工	舗設現場	必須	温度測定（初転圧前）	温度計による。		随時	測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）	
32 排水性舗装工・透水性舗装工	舗設現場	必須	現場透水試験	舗装調査・試験法便覧 [1]-154	X10 X10 1,000mL/15sec 以上 300mL/15sec 以上（歩道箇所）	1,000m ² ごと。		

32 排水性舗装工・透水性舗装工	舗設現場	必須	外観検査（混合物）	目視		随時		
セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）	施工	必須	塩化物総量規制	「コンクリートの耐久性向上」	原則 0.3 kg/㎡以下	コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。（1試験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50㎡未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。1工種当たりの総使用量が50㎡以上の場合は、50㎡ごとに1回の試験を行う。・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C 502-2018、5032018）または設計図書の規定により行う。・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種）	試験結果 報告書 参考
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）	施工	必須	単位水量測定	「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）」	1）測定した単位水量が、配合設計±15kg/㎡の範囲にある場合はそのまま施工してよい。2）測定した単位水量が、配合設計±15kg/㎡を超え±20kg/㎡の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/㎡以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。なお、「15kg/㎡以内で安定するま	100㎡/日以上の場合；2回/日（午前1回、午後1回）以上、重要構造物の場合は重要度に応じて、100㎡～150㎡ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときとし、測定回数は多い方を採用する。	示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/㎡、40mmの場合は165kg/㎡を基本とする。	

					で」とは、2回連続して15kg/㎡以内の値を観測することをいう。3) 配合設計±20kg/㎡の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の配合設計±15kg/㎡以内になるまで全運搬車の測定を行う。なお、測定値が管理値または指示値を超えた場合は1回に限り再試験を実施することができる。再試験を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。			
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）	施工	必須	スランブ試験	JIS A 1101	スランブ 5cm 以上 8cm 未満：許容差±1.5cm スランブ 8cm 以上 18cm 以下：許容差±2.5cm スランブ 2.5cm：許容差±1.0cm	・荷卸し時1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に応じて20㎡～150㎡ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。ただし、道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクストコンクリートを用いる場合は原則として全運搬車測定を行う。・道路橋床版の場合、全運搬車試験を行うが、スランブ試験の結果が安定し良好な場合はその後スランブ試験の頻度について監督職員と協議し低減することができる。	・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50㎡未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。1工種当りの総使用量が50㎡以上の場合は、50㎡ごとに1回の試験を行う。※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種）	
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）	施工	必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値）	・荷卸し時1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に応じて20㎡～150㎡ごとに1回。なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき6個（σ7...3個、σ28...3個）とする。・早強セメントを使用する場合には、必要に応じて1回につき3個（σ3）を追加で採取する。	・小規模工種※で1工種当りの総使用量が50㎡未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。1工種当りの総使用量が50㎡以上の場合は、50㎡ごとに1回の試験を行う。※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅2.0m以上）、護岸、ダム	

							及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種)	
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）	施工	必須	空気測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%（許容差）	・荷卸し時1回／日以上、構造物の重要度と工事の規模に応じて 20 m ³ ～150 m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	・小規模工種※で1工種当りの総使用量が 50 m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。1工種当りの総使用量が 50 m ³ 以上の場合は、50 m ³ ごとに1回の試験を行う。※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。（橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、高欄等）、擁壁工（高さ1m 以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路（内幅 2.0m 以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種）	
1 セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）	施工	必須	コンクリートの曲げ強度試験（コンクリート舗装の場合、必須）	JIS A 1106	1回の試験結果は指定した呼び強度の 85%以上であること。3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。	打設日1日につき2回（午前・午後）の割りで行う。なおテストピースは打設場所で採取し、1回につき原則として3個とする。		

出来形管理計画

1. 目的・適用

本工事の出来形（寸法・高さ・厚さ・幅等）を、出来形管理基準に定める測定項目・測定基準により実測し、設計値と実測値を対比した出来形管理図表を作成し管理する。測定結果はその都度記録し、監督職員の請求に対し提示できるよう保管する。

※測定基準が「〇〇につき 1 箇所」の場合は、小数点以下切り上げで箇所数を確保する。

2. 対象工種（本工事）

- 透水性舗装工（開粒度透水性舗装／表層）約 49.8 m²
- 土間工（コンクリート土間）約 14.6 m²
- 集水枳工 2 基（240、300）

3. 実施体制

- 測定・記録：施工管理担当者（出来形担当）
- 確認：現場代理人
- 立会い：監督職員の指示がある場合に実施

4. 使用機器

レベル・スタッフ、巻尺、直尺、下げ振り、舗装厚さ確認（コア採取）等。

5. 出来形管理項目・測定基準（計画）

3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	1		一般事項 （切込砂利）（砕石基礎工）（割ぐり石基礎工） （均しコンクリート）	測定項目	規格値		測定基準 施工延長 40m （測点間隔 25m の場合は 50m） につき 1 ケ所、 延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 ケ所。	測定箇所	3-2-4-1	
						幅 w	設計値以上					
						厚さ t	－30					
						延長 L	各構造物の規格値による					
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	30		集水枘工	基 準 高 ▽	± 30		1 ケ所毎※は、 現場打部分のある場合		3-2-3-30	
						※厚さ t 1 ～ t 5	－ 20					
						※幅 w 1, w 2	－ 30					
						※高さ h 1, h 2	－ 30					
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値			測定基準	測定箇所	摘要
							個々の測定値 （X）		平均の 測定値 （X10）			
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上			
3 土	2 一	6 一	10	1	透水性 舗装工	基準高▽	± 50		—	基準高は片側延長 40m 毎に 1 ケ所の割		3-2-6-10
						厚さ	t < 15	-30	-10			

木 工 事 共 通 編	般 施 工	般 舗 装 工			(路盤 工)		cm			で測定。厚さは、片側 延長 200m 毎に 1 ヶ所 掘り起こして測定。幅 は、片側延長 80m 毎 に 1 ヶ所測定。※歩道 舗装に適用する。		
							t 15 cm	-45	-15			
						幅		-100	—			
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	10	1	透水性 舗装工 (表層 工)	厚さ		-9	-3	幅は、片側 延長 80m 毎 に 1 ヶ所の 割で測定。 厚さは、片 側延長 200m 毎に 1 ヶ所 コアを採 取して測 定。※歩道 舗装に適用 する。		3-2-6-10
						幅		-25	—			

6. 測定の実施手順（流れ）

1. **施工前**：図面・設計値（厚さ、幅、天端高、勾配）を整理し、測定位置を決める。
2. **施工中**：型枠／据付完了時点で、厚さ・高さの“事前確認”を行い手戻りを防止。
3. **施工後**：仕上げ完了後に出来形を実測し、出来形管理図表へ転記。
4. **不適合時**：規格値外の場合は原因を確認し、必要に応じて撤去・再施工等で是正し、再測定する。

7. 記録・提出

- 出来形管理図表（設計値／実測値／差／判定／測定者／確認者）
- 出来形管理写真（測定状況、測定値が読める状態、測点が見える引き写真）
- 測定機器（レベル等）使用状況が見える写真を併せて整理

（工事写真は施工管理の手段として適切に撮影・保管し、検査時に提出する。）

写真管理計画

1. 目的

本工事の工事写真は、施工管理（施工状況、品質、出来形等）の証拠資料として、設計図書に適合した施工が行われたことを明確にするために撮影する。特に不可視となる工程（フィルター層、路盤等）については、次工程着手前に撮影を確実に実施し、写真台帳として整理する。

2. 準拠

写真管理は、設計図書、土木工事共通仕様書、写真管理基準（発注者指定）、電子納品要領等に基づき実施する。電子黒板等を使用する場合は、発注者の運用ルールに従う。

3. 管理体制

写真管理の責任者は現場代理人とし、主任技術者（または担当者）を写真管理担当者として配置し、撮影・整理・保管を行う。撮影漏れ防止のため、日々の作業前に当日撮影すべき写真（不可視部・出来形等）を確認する。

4. 撮影方法（基本）

工事写真は原則としてカラーで撮影し、次の事項を満たす。

- (1) 工事名、工種、測点（箇所）、撮影日、施工者等が識別できるよう黒板を併記する。
- (2) 出来形写真はスケール（スタッフ、巻尺等）を入れ、寸法が読み取れる角度で撮影する。
- (3) 施工状況写真は、工程の進捗（着手前→施工中→完了）が分かるよう同一箇所を適切に撮影する。
- (4) ブレ、逆光、ピンぼけを避け、必要に応じて全景・近景を撮影する。
- (5) 安全を最優先し、重機稼働範囲内での撮影は合図者配置等により安全を確保する。

5. 写真区分

写真は、以下の区分で整理する。

- (1) 着手前及び完成写真
- (2) 施工状況写真（各仕様書等に基づいた施工方法の証明記録）
- (3) 安全管理写真（安全管理の実施状況の具体的な記録）
- (4) 使用材料写真（工事使用材料の品質と寸法の証明記録）
- (5) 品質管理写真（品質確認等の試験状況の記録）
- (6) 出来形管理写真（構造物の数量、寸法等出来形証明の記録）
- (7) 災害写真（工事中に発生した災害及び事故等の記録）
- (8) その他（環境対策、補償対策などの記録）

6. 整理・保管方法

工種ごとに写真番号を付与し、写真台帳に「写真番号、撮影日、撮影箇所、写真区分、内容、対応する測点・計測記録」を紐付けて整理する。電子納品を行う場合は、発注者指定の要領に従い、工事写真データを所定のフォルダへ格納し、写真管理ファイルと整合させる。撮影データは工事完成まで適切にバックアップし、原本データを保全する。

7. 留意事項

- (1) 不可視部（フィルター層、路盤、埋戻し等）は、次工程着手前に「施工状況＋出来形（厚さ）」の両方を撮影する。
- (2) 出来形写真は、スケールが読み取れること（数値が判別できること）を撮影直後に確認する。
- (3) 日付・測点・写真番号が台帳と一致するよう、当日中に整理（仮台帳作成）を行う。
- (4) 変更箇所がある場合は、変更前後が分かる写真と、位置関係が分かるスケッチを併せて残す。

写真管理基準

区分	工種	写真管理項目			摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回〔着手前〕	着手前1枚	
	完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回〔完成後〕	施工完了後1枚	
		全景又は代表部分の工事進捗状況	月1回〔月末〕	不要	

施工状況写真	工事施工中	施工中の写真	工種、種別毎に共通仕様書及び諸基準に従い施工していることが確認できる ように適宜　〔施工中〕	適宜	
			高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 〔施工中〕	不要	高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付
	仮設（指定仮設）	使用材料、仮設状況形状法	1 施工箇所 に 1 回 〔施工前後〕	代表箇所 1 枚	
	図面との不一致	図面との不一致の真	必要に応じて 〔発生時〕	不要	工事簿に添付する
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に 1 回 〔設置後〕	全景 1 枚	
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に 1 回 〔設置後〕		
		監視員交通整理状況	各 1 回　〔作業中〕		
		安全訓練等の実施状況	実施毎に 1 回 〔実施中〕	不要	実施状況資料に添付
使用材料	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	各品目毎に 1 回 〔使用前〕	不要	品質証明に添付する。
		品質証明（JIS マーク表示）	各品目毎に 1 回		
		検査実施状況	各品目毎に 1 回〔検査時〕		
品質管理写真	別添　品質管理写真撮影箇所一覧表に記載				
出来形管理写真	別添　出来形管理写真撮影箇所一覧表に記載				
災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	適宜	
事故	事故報告	事故の状況	その都度〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜	発生前は付近の写真でも可
その他	補償関係	被害又は損害状況等	その都度〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜	
	環境対策 現場環境改善等	各施設設置状況	各種毎 1 回 〔設置後〕	適宜	

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
3	2	3	30		集水桝工	厚さ 幅高 さ	全数量〔型枠取外し後〕	タイプごとに 代表1枚	
3	2	4	1		一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅厚 さ	40mごとに1回、延長40m未 満は2回〔施工後〕	40m ごとに1 枚、延長40m 未満は2枚	
3	2	6	10	1	透水性舗装工 路盤工	敷均し厚さ・転 圧状況	40mごとに1回、延長40m未 満は2回〔施工中〕	80mごとに 枚、延長80m未 満は2枚	
						整正状況	40mごとに1回、延長40m未 満は2回〔整正後〕		
						厚さ	各層200mごとに1回、延長 200m未満は2回〔整正 後〕	200m ごとに1 枚、延長200m 未満は2枚	
						幅	各層80mごとに1回、延長80m 未満は2回〔整正後〕	80m ごとに1 枚、延長80m 未満は2枚	
3	2	6	10	2	透水性舗装工 表層工	整正状況	40mごとに1回、延長40m未 満は2回〔整正後〕	80mごとに 枚、延長80m未 満は2枚	
						タックコート、 プライムコー ト	40mごとに1回、延長40m未 満は2回〔散布時〕		
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	全枚数	

段階確認計画

1. 目的

段階確認は、工事完成後に確認できない不可視部の上層路盤および品質に影響の大きい工程について、品質・施工状況を確認し、品質確保を図ることを目的として実施する。

2. 実施方法

段階確認は、特記仕様書より実施する。段階確認の対象工程に到達した時点で、受注者は事前に監督職員へ連絡し、必要に応じ立会いを受ける。確認結果は段階確認書または打合せ簿により整理し、写真、黒板、計測記録を添付して保管する。

3. 留意事項

段階確認後は、確認対象部を覆工・埋戻し・舗装等で不可視化する工程に移行しない。不適合が認められた場合は是正後に再確認を行う。

段階確認項目

アスファルト舗装工、上層路盤、 確認項目：転圧・敷均の状況・仕上り

確認時期：表層施工前

項目	記載内容
種別	アスファルト舗装工
細別	上層路盤工
確認項目	転圧・敷均の状況・仕上り
確認時期	表層施工前

材料確認

1. 目的

本工事に使用する材料について、設計図書、土木工事共通仕様書等に定める品質・規格・種別に適合していることを、材料証明書類（試験成績表、配合資料、出荷証明、納品伝票等）及び受入時確認により事前に確認し、所定の品質を確保することを目的として実施する。

2. 対象材料

本工事における材料確認の対象は、**アスファルト混合物**（表層用：開粒度アスファルト混合物）とする。

3. 確認方法

材料確認は、次の方法により実施する。

- (1) 書類確認：材料名、種別、規格、製造工場、配合等が設計図書に適合することを、配合資料、試験成績表、出荷証明等により確認する。
- (2) 受入確認：搬入時に納品伝票により材料名・種別・数量・出荷日時を確認し、外観（分離、異物混入、ダメージ等）を目視確認する。
- (3) 施工時管理との連携：荷卸し時温度等、施工条件に関する記録を採取し、品質記録として整理する。
- (4) 不適合時対応：不適合が疑われる場合は当該材料の使用を停止し、監督職員と協議の上、代替材料の手配、再確認又は返品等の是正措置を行う。

4. 記錄・整理・提出

材料確認に係る資料は、工種ごとに整理し、監督職員の請求に応じて速やかに提示できるよう保管する。工事完成時には、必要に応じて取りまとめて提出する。

5. 留意事項

- (1) 材料名・種別・規格の表記は、設計図書の表記と一致させる。
- (2) 変更設計等により材料が変更となる場合は、使用前に監督職員と協議し、必要な材料確認資料を再提出する。
- (3) 材料の保管・運搬においては、品質低下を防止する。

品質管理基準及び規格値

35 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	「舗装施工便覧」3-3-2(3)による。	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上での管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が10,000m ² あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 ・小規模工事とは、上記以外の場合が該当する。	○
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	碎石・玉砕、製鋼スラグ(SS)表乾比重：2.45以上 吸水率：3.0%以下			○
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量：0.25%以下			○
			粗骨材の形状試験	舗装調査・試験法便覧[2]-51	細長、あるいは扁平な石片：10%以下			○
			フィラーの粒度試験	JIS A 5008	「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。			○
			フィラーの水分会試験	JIS A 5008	1%以下			○

立会確認計画

受注者は、表層（開粒度アスファルト混合物）施工前に、下地（上層路盤）の出来形および施工条件を確認するため、（特記仕様書記載のため）監督職員の立会確認を受ける。立会が困難な場合は、監督職員と協議の上、写真および計測記録により確認する。

立会確認対象

種別	確認方法・目的	確認時期	備考
境界確認	積測量図に基づき、境界点の確認を行う。	11月30日予定	
アスファルト舗装工	敷き均し温度	施工中	

記録

立会確認結果は、立会確認書により整理し、確認状況写真、黒板および計測記録を添付して保管する。

品質証明計画

1. 目的

本工事の品質証明は、設計図書及び土木工事共通仕様書等に適合した材料を使用し、所定の施工方法により品質を確保したことを、客観的な記録（証明資料）により明確にすることを目的として実施する。

2. 準拠

品質証明は、設計図書（特記仕様書、施工管理基準、図面等）及び発注者の施工計画作成要領に基づき実施する。提出・提示する資料の種類、様式、提出時期は監督職員の指示に従う。

3. 証明の範囲

品質証明の対象は次のとおりとする。

- (1) フィルター層（山砂（洗い） t=5cm、75μm 通過 6%以下）
- (2) 上層路盤（RC-30 t=10cm）

(3) 表層（開粒度アスファルト混合物 t=4cm）

(4) コンクリート舗装（土間：路盤 t=10cm、型枠、コンクリート t=10cm）

4. 品質証明資料

品質証明資料は、原則として以下を工種ごとに整理し、相互に紐付ける

(1) 材料関係資料

- 材料証明
- 納品伝票／出荷証明
- 配合資料、プラント出荷伝票

(2) 施工・品質管理記録

- 施工時管理記録
- 品質試験成績
- 不適合時の是正記録

(3) 出来形・写真資料

- 出来形管理記録
- 工事写真
- 段階確認／立会確認の記録

5. 整理方法

品質証明資料は「工種別」にファイル化し、次のように整理する。

- 材料関係（証明・伝票）
- 品質管理記録（試験・温度・転圧）
- 出来形管理記録（計測）
- 写真（写真台帳）

各資料は、測点・写真番号・伝票番号等を共通キーとして相互参照できるよう整理し、監督職員の請求に対し速やかに提示できるよう保管する。

6. 提出時期

品質証明資料は、工事完成時に提出することを基本とし、監督職員の指示により、施工中または月次で提出・提示する。不可視部に関する資料は、次工程着手前に整理し、必要に応じて立会確認時に提示する。


・ 安全管理

1) 基本方針

人権尊重の理念に基づき、全員の一致協力により「安全即施工」「施工即安全」を推進します。

”人の安全も自分が守る”、”自分の安全は自分で守る”という強い念を持ち、安全第一、健康第一を基本理念として安全施工で災害ゼロを実現します。

安全管理組織

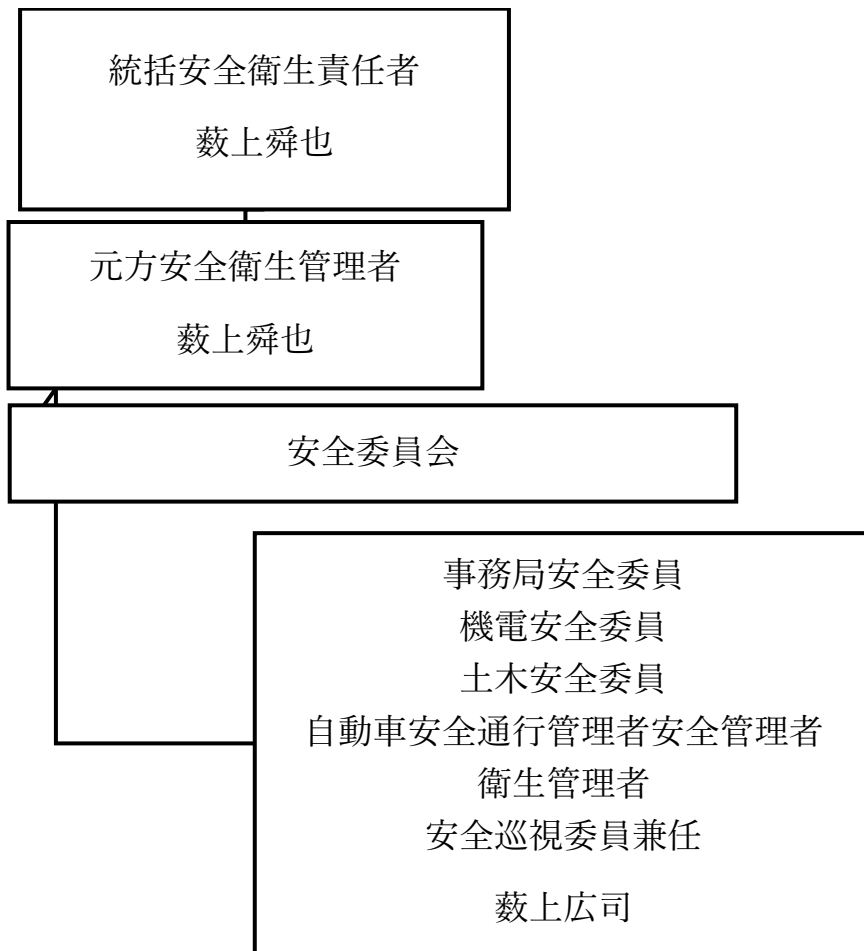

②その他の必要事項

1. 工事現場周辺の危害防止

工事区域の立入防止措置及び現道占用の管理

(1) 本工事は、一般歩道新設施工となり、施工時には仮囲い（セフティーコーン、コーンバー等）にて区域の明示を行い、昼・夜間にも対応したものを使用する。

(2) 看板類（工事看板・予告看板）等は、所定の場所に交通の支障とならないよう設置し、振動や風等で倒れないよう固定したうえ、常に保守管理を行う。

(3) 本工事に配置する交通誘導員は、予定通り適時配置する。

2. 工事作業時の危険防止

作業員への励行事項

作業時の服装等

工事関係者は、保安帽・作業衣・作業靴を着用し作業を行う。

3. 直機、機械類の危険防止 (1) 監視員、誘導員の配置

重機（バックホウなど）の施工時や舗設機線（特に転圧ローラー類）の前後移動等の危険作業時は、必要に応じて合図員を配置し接触事故防止に努める。

(2) 工事用重機械等の運転資格と管理

重機類の運転に関しては、必ず有資格者が運転し、作業安全を確保する。

4.資材搬入・雑材搬出及び資材置き場の管理方法

(1) 入・搬出ルートの設定

施工作前調査により付近環境、交通状況を充分勘案し、搬入・搬出ルートを設定して、関係運転者に周知徹底する。

(2) 工事現場車両出入口の安全確保

施工範囲から工事車両の出入りの際は、出入り口付近での一旦停止・左右確認を確実に行之、出入りするよう各運転手に周知し、一般車両・歩行者・自転車との接触事故防止に努める。

(3) 資材置き場の管理

本工事は、歩道部の舗装工事であり、必要資材は、当日直接搬入とします。

3 第三者施設安全管理対策

1. 家屋

本工事施工箇所付近の家屋に対して、地盤沈下、騒音、振動、悪臭等をできるだけ防止するとともに、地元住民との紛争を起こさないよう細心の注意を払います。

2.地下埋設物及心近接施工

工事着手に先立ち、埋設物の有無を確かめ、必要であれば現地にて埋設物管理者に立会を求めます。尚、支障となる埋設物は作業関係者全員に周知徹底を図り、作業中の埋設物事故防止に努めます。

3. 通行人等

工事現場に必要かつ十分な保安柵、表示看板、を配置し、地元住民、通行人等に危害や物件損害を及ぼさないようにします。

4.工事車両通行路

資材等運搬時は、積載物の落下等により路面を損傷・汚損することのないよう留意します。

緊急時の体制及び対応


大雨、強風等の異常気象時又は地震発生時の対策及び災害が発生した場合に対する体制及び連絡系統は、下記の通り。

パトロールを行う異常気象要件


- ・大雨・・・時間雨量 50mm、連続雨量 250mm に達した時点
- ・台風・・・気象庁発表情報にて強風圏内に現場付近が入った時点
- ・地震・・・現場を含む市町村において震度 4 以上が発生した時点
- ・強風・10 分間の平均風速が 10m/s に達した時点

災害対策組織体制表

大雨、強風等の異常気象で、災害発生のおそれがある場合には、必要に応じて現場内のパトロールを行い戒に当たる。

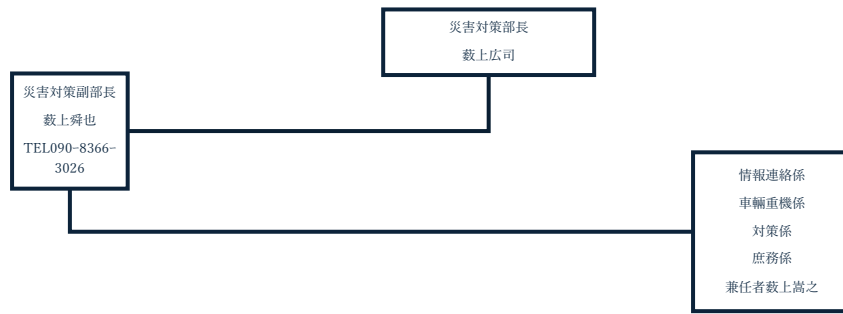

緊急時の体制連絡系統図

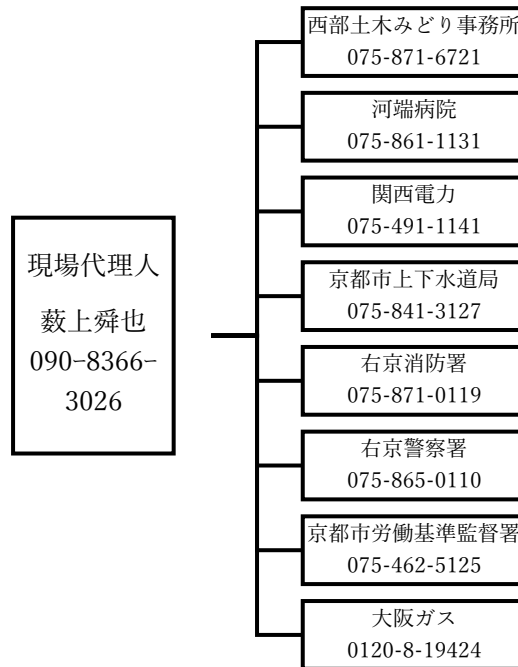

9 緊急時の体制及び対策

(1) 警戒宣言に伴う臨機の措置

労働安全規則に違反することの無きよう現場内の機械等には細心の注意を払って管理する。

大規模地震の注意報が発令された場合には、何時でも避難できるように安全措置を整える。大規模地震の警戒宣言が発令された場合には、工事を直ちに中断し、工事現場内の安全措置をとる。

- 工事施工中の場合は作業を中止する。
- ダンプトラック等の運転を中止し、一般交通等第三者に対する安全を確保する。
- 機械及び器材等は安全な場所に待機する。

安全が確認され、現場に最も近い地域でして指定された緊急避難所に全員で移動し、避難所では情報端末等により情報収集に努め、状況を把握し警戒に努める。

万が一、作業中に大規模地震に遭遇した場合は、危険箇所から離れ安全を確保する。

一次避難場所に全員集合し、全員の安否確認と共に、現場内の被害状況を調査し、二次災害防止に努める。

現場内の防火

- ① 火気取り扱い責任者をきめ消火器を設置し巡回・点検を行う。
- ② 現場内全てを禁煙とします。喫煙する人は通勤で使用している車両内とする。

現場内の労働安全衛生

- ① 職員、作業員の健康管理に努め『自己健康管理の徹底』を目標にします。

② 現場内は整理整頓に努め『一仕事一片付け』を目標にします。

地元への周知

工事着手前に地元住民に工事ビラを配布して地元へ周知する。

休日の確保

労働基準法(第四章)第三十三条

休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法(第四章)第三十五条

毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の日を与えなければならない。以上の事から現場においては、作業時間は、9:00~17:00(実働6時間30分)とする。

休憩時間は、10:15~10:30(15分),12:00~13:00(60分),15:15~15:30(15分)計1時間30分

とする。なお、天候・工程によって作業時間帯が前後する。

作業時間・休憩時間は、新規入場者教育の資料に記載し周知する。

不稼働がない場合でも6時間30分*6日=39時間/1週間となり休日の確保が

労働基準法を遵守する。

平日作業を原則とする。

交通管理

交通安全対策

- (1) 交通関係法令に定められている事項は必ず守る。
- (2) 雨天・強風・凍結時は速度や車間距離の安全確認を特に行う
- (3) 市街地における自動車の運行速度は、制限速度以下とするように徹底指導する。
- (4) 公道を走行するときは歩行者・一般車両を最優先し法定速度を厳守する。
- (5) 現場周辺に緊急車両が通行する時、工事車両は通行の妨げを絶対にしない。
- (6) 冬場現場工区内は積雪量が多くなる場合、天気予報など十分に確認した後実施し、現場内進入が不可能な場合は施工を中止する。

過積載防止対策

- (1) ダンプトラック、材料搬入車両は道路交通法を厳守し過積載のないよう運搬します。

化石解剖し対策として重機の運転手ダンプの運転手の積込を任さないで元請職員（現場代理人等で目視確認した後、処分場に搬出する。

運搬管理補油を作成して搬入伝票の積載重量を管理します。


過積載防止対策

《過積載と疑わしい車両の目安》

ダンプトラックのメーカー、車両により許容積載量に差異があるが、過積載の目安として、土砂及び碎石・AS合材等の建設資材は均した状態で平ボディの嵩高いっぱいまで、AS/CO殻及びAS切断殻は平ボディの上への嵩高20cmまでは定量による積載とみなす。

ただし、土砂及び碎石・AS合材等の建設資材については、通常均した状態で運搬していない場合もあり、平ボディの嵩高以上であっても、均した場合嵩高いっぱいまでと判断できる場合は定量による積載とみなす。

なお、計測は目視によるものとする。

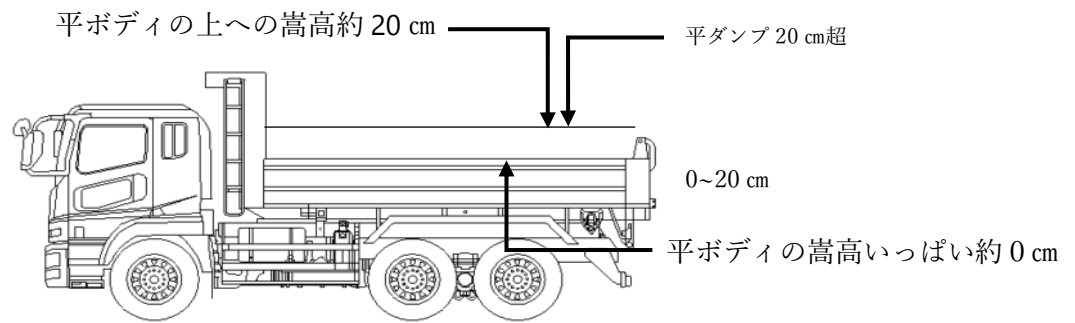

環境対策

騒音・振動対策

工事施工中は、重機その他の車両による騒音、振動を極力抑えるように努める。

工事の円滑化を図るとともに、現場管理等に留意し、不必要な騒音・振動を発生させない。建設機械等は、整備不良による騒音・振動が発生しないように、点検・整備を十分に行う。

作業中・待機している建設作業機械は、エンジンを止めるよう心掛ける。

防塵対策

公道にダンプトラックの車輛等に付着した泥が散乱した場合は、速やかに、清掃する。必要に応じて清掃員を配慮し、一般通行人及び車両に迷惑のかからないように配慮する。本工事施工範囲は施工材料等散乱しないよう一仕事一片付けを徹底し作業します。

現場作業環境の整備

工事中の作業区域内環境の整備

(1)工事施工中は、資材・工具・機械・廃材等が風等で飛散しないように 作業終了時及び、定期的に工事区域内を整理整頓しながら工事施工を行う。

(2)施工時に生じるゴミは、現場各箇所にゴミ箱を設置し、燃える・燃えない等の分別を行い処理をする。また、風等によりゴミが飛ばないように配慮する。

(3)作業所、資材置き場等の資機材は適宜整理し、残材、不要材は整理処分し、現場内の整理整頓に努める。

工事現場内のイメージアップ

(1)夜間照明は、カラーコーンに太陽電池式フラッシュライトを使用する。

現場内環境対策

(1)排気ガス・騒音対策として使用機械は排ガス規制、騒音規制シールが明示しているものを、使用する。

(13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

1. 適用・基本方針

本工事においては、再生資源の利用を積極的に行うとともに、建設副産物については「発生抑制 → 再使用 → 再生利用 → (必要に応じて) 熱回収 → 適正処理」の優先順位を踏まえ、現場分別の徹底、適正な運搬・処理、記録管理を行う。

2. 対象工事の該当確認

□ 請負金額：1,393,700 円

- ・100 万円以上の場合：事前に「再生資源利用計画書」「再生資源利用促進計画書」を作成し施工計画書へ添付する。
- ・工事完了後：実施結果として「再生資源利用実施書」「再生資源利用促進実施書」を作成する。

3. 再生資源利用計画（搬入材）

搬入する資材について、再生資源の利用量、再生材の種別、供給元を明確にし、別紙「再生資源利用計画書」に記載する。

- ・別紙 1：再生資源利用計画書（搬入材：AS 殻、CO 殻、発生土）

4. 再生資源利用促進計画（建設副産物）

建設副産物について、発生見込量、搬出先または他工事現場への搬出量等を整理し、別紙「再生資源利用促進計画書」に記載する。

〔別紙添付〕

- ・別紙 2：再生資源利用促進計画書（対象：AS 殻、CO 殻、発生土）

5. 搬出経路

建設副産物の運搬については、現場から搬出先までの運搬経路を地図上に示し、概ねの運搬距離（km）を記載する。交通量・道路幅員等の道路条件を事前確認のうえ、交通混雑時間帯を避ける等の配慮を行う。

〔別紙添付〕

- ・別紙 3：建設副産物搬出経路図（運搬距離：概ね 20km）

6. 現場分別・保管・飛散流出防止

(1) 現場分別：品目ごとに分別し、混入防止を徹底する。
)

(2) 保管：飛散・流出・悪臭・騒音等の防止措置を行い、必要に応じてシート養生・囲い等を実施する。

(3) 搬出管理：搬出日、品目、数量、搬出先、運搬車両等を記録し、帳票で管理する。

7. 運搬・処理の委託

- (1) 産業廃棄物として委託する場合は、収集運搬業者・処分業者それぞれの許可内容を確認する。
- (2) 委託契約は書面で締結し、契約書には許可証等（写し）を添付する。
- (3) 産業廃棄物の搬出時は、品目ごとにマニフェストにより、排出から最終処分までの流れを把握・管理する。


- ・別紙４：産業廃棄物収集運搬業許可証（写し）
- ・別紙５：産業廃棄物処分業許可証（写し）
- ・別紙６：委託契約書（写し）
- ・別紙７：マニフェスト運用方法（紙／電子、運用体制の概要）


8. 該当なしの取扱い

本工事において上記のうち該当しない項目がある場合は、「該当なし」と記載する。

（記載欄）

- ・再生資源（搬入材）の主な使用予定：開粒度、21-8-20BB、山砂、RC30
- ・建設副産物（搬出）の主な発生予定：AS 殻、CO 殻、発生土
- ・主な搬出先（再資源化施設等）：洛東建設 玉井建設株式会社

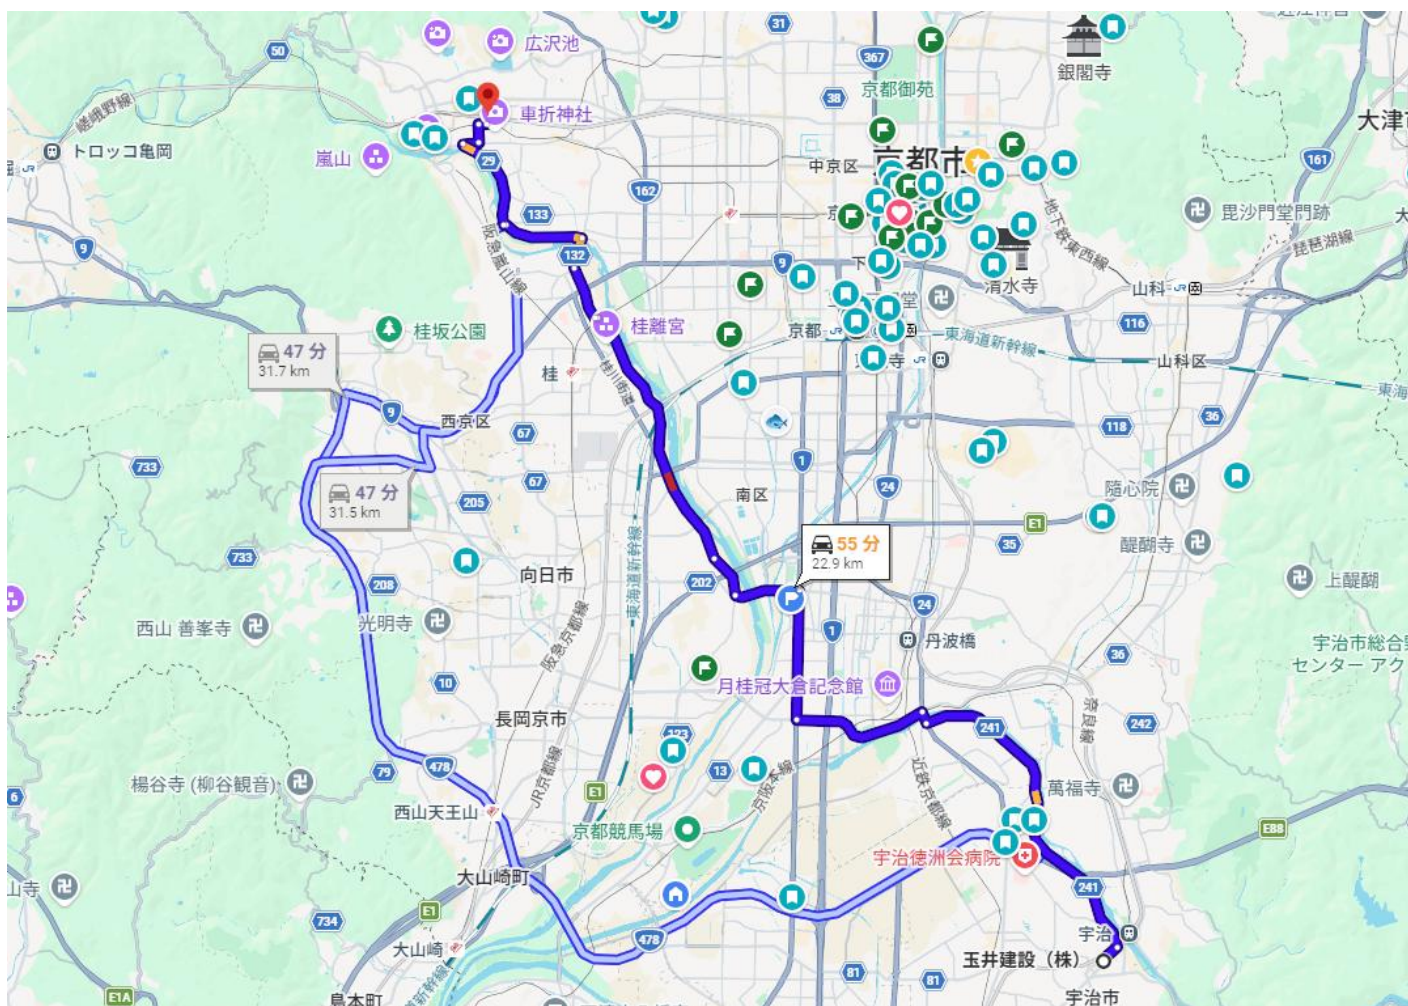

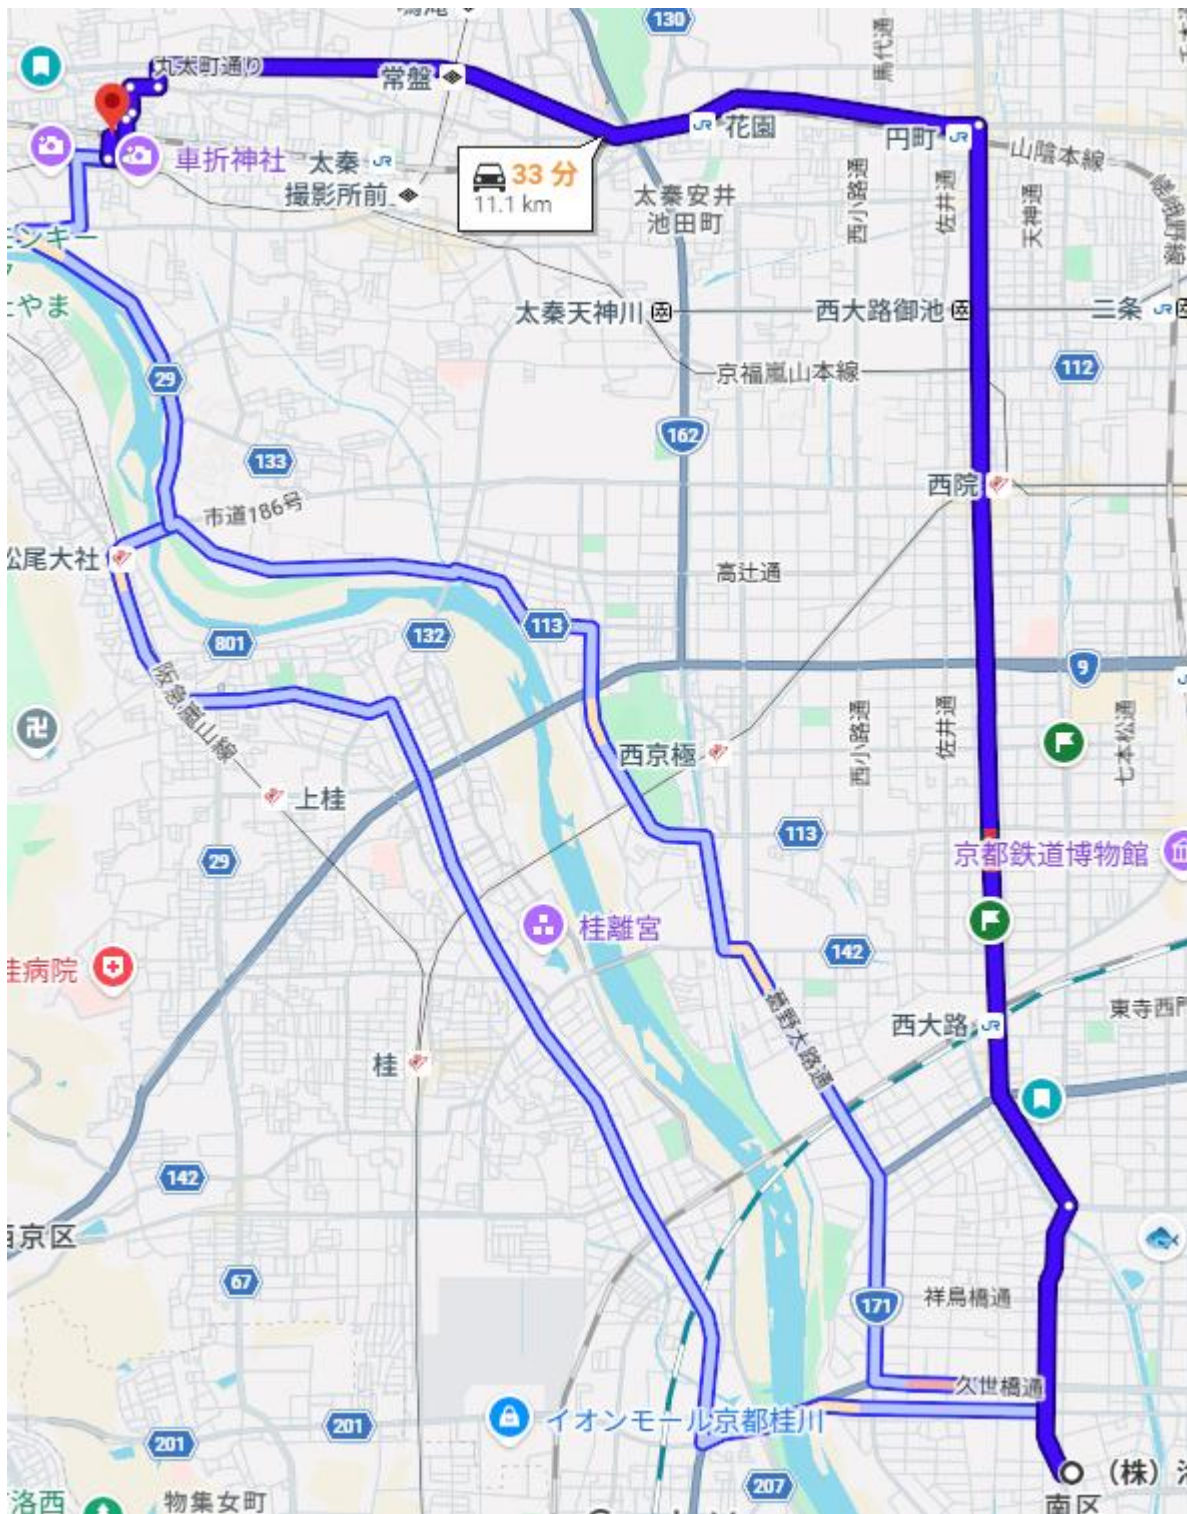

14-1 その他

(8) 注意点

施工に従事する作業員は、自分の住んでいる家を工事している気持ちで、丁寧な気配り、目配りをもって、地域住民の人々に喜ばれるよう、全員の気持ちを一つにして仕事をします。

(9) 健康被害

病原菌等で集団感染の恐れがあるときは、予防対策（マスク着用、手洗いうがいの徹底、近距離での接触、体調不良の作業員を自宅待機させる）を行う。
