


照 査 結 果 報 告 書

工事名:舗装新設工事(嵯峨126号線他)

照 査 項 目	照 査 結 果	提 案	協 議(回 答)
1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。	・該当なし。		
2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。	・該当なし。		
3)設計図書の表示が明確でないこと。	・該当なし。		
4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。	・事前測量をした結果、縦断勾配を確保するために施工範囲内の樹の高さの調整が必要あり。 ・官民境界付近の民地側の土間コンクリートが現在適切な排水勾配が確保できていないため土間コンクリートをやり替える必要あり。	・集水樹新設 ・土間コンクリートの施工範囲拡張	・集水樹新設:2箇所別紙1の図面の通りに施工してください。 ・土間コンクリートの施工範囲拡張 適切な排水勾配を確保して別紙2の図面の通りに溶接金網を追加して施工してください。 なお、実施面積は改めて、報告してください。
5)設計図書で明示されてない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。	・該当なし		
6)その他	・事前測量報告書の提出 ・施工範囲が歩道部であり、設計図書の舗装構成ではなく透水性舗装の舗装構成のほうが水処理が確実なので透水性舗装に変更を提案	・舗装構成を透水性舗装に提案する。	・舗装構成を透水性舗装に提案する。 透水性舗装は承認施工で行ってください。 別紙3の舗装構成で施工してください。また承認施工の中で品質確認を行ってください。

集水桝 S=NS

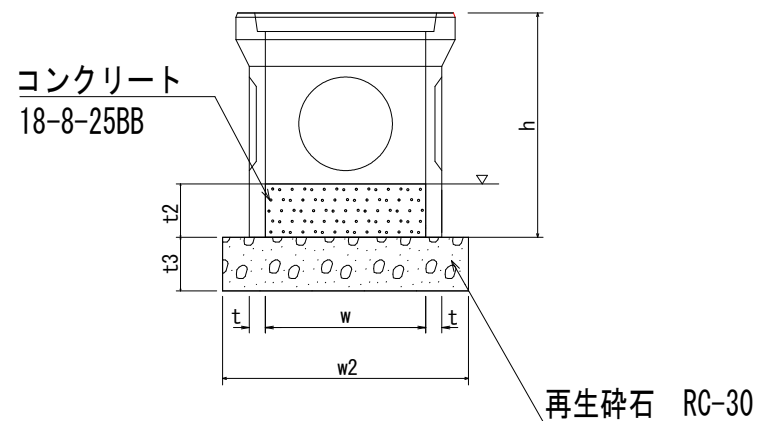

※既設の流入管・流出管（φ100程度）と桝との
接続は逆流、漏水が生じないよう措置すること。

集水桝

種別	寸 法					
	厚さ (t)	コンクリート 厚さ (t2)	幅 (w)	高さ (h)	底部高▽	蓋
240用	25	140	240	365	270	コンクリート
300用	30	100	300	460	-310	グレーチング


※300用にはグレーチング蓋（細目T-14）、240用にはコンクリート蓋を使用すること

再生砕石

種別	寸 法	
	厚さ (t3)	幅 (w2)
240用	100	390
300用	100	460

別紙2

土間コンクリート

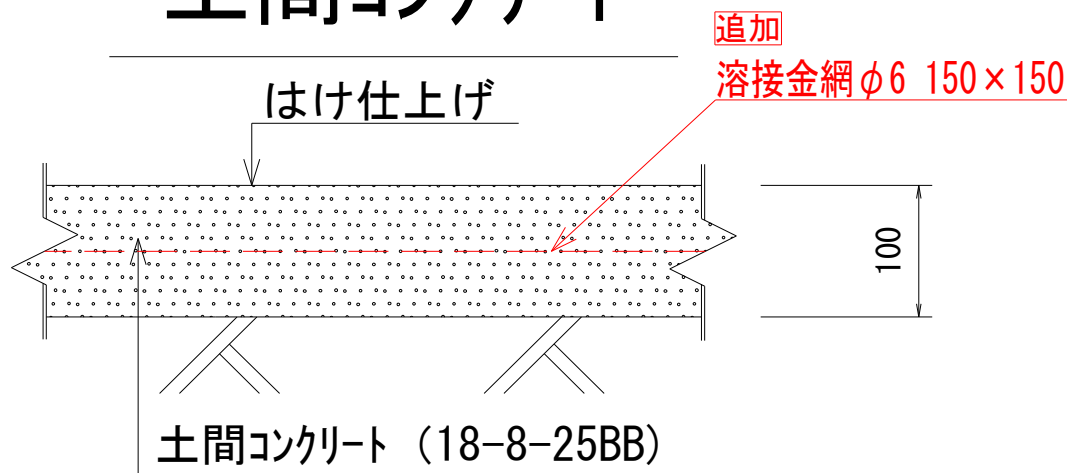

単位数量表

m2当り


コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-25BB	0.1	m3
溶接金網	φ6 150×150	1.0	m2

別紙3

作成年月	令和 6 年 8 月	図面名	歩道舗装工（一般部・乗入部）	第Ⅱ編舗装	項	1 - 1	No.	56
------	------------	-----	----------------	-------	---	-------	-----	----

歩道舗装工（一般部）

S=1/20



表層：開粒度アスコン(13) t= 4cm (密度2.05t/m³)

路盤：再生クラッシャーラン (RC-30) t=10cm

フィルター層：山砂(洗い・真砂土、75 μ m通過6%以下) t=5cm
